

概要書

一般県道 ^{たかおかゆのき} 鷹岡柚木線 ^{りゅうがん} 【龍巖橋】

1. 概要

一般県道^{たかおかゆのき}鷹岡柚木線は、富士市^{ふじ}天間^{てんま}を起点に富士市^{ふじ}柚木^{ゆのき}に至る幹線道路であり、龍巖橋はこの路線上にある橋脚を有する橋梁である。

龍巖橋の現況幅員は5.6mであり、大型車両のすれ違いが困難な現状を解消するため、既存橋梁の拡幅を行う。

- 事業区間：^{しずおか}静岡県^{ふじ}富士岩本
- 事業主体：^{しずおか}静岡県
- 延長・規格：延長0.0407km、3種3級(40km/h)、幅員6.50m
- 事業着手年度：令和4年度
- 全体事業費：327.0百万円
- R4当初事業費：85.0百万円（国費：42.5百万円）
- R4補正事業費：0百万円（国費：0百万円）
- R5当初事業費：242.0百万円（国費：121百万円）
- R6以降残事業費：0百万円（R4まで進捗率20%）

2. 令和5年度事業内容

^{ふじ}富士市岩本



- ・橋梁上部工拡幅を推進

（本事業における用地取得なし）

〔令和5年3月末現在〕

3. 今後の予定

- ・令和5年度末の完了を目指す（未公表）

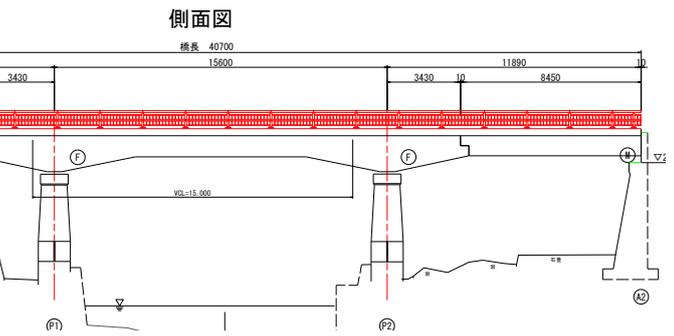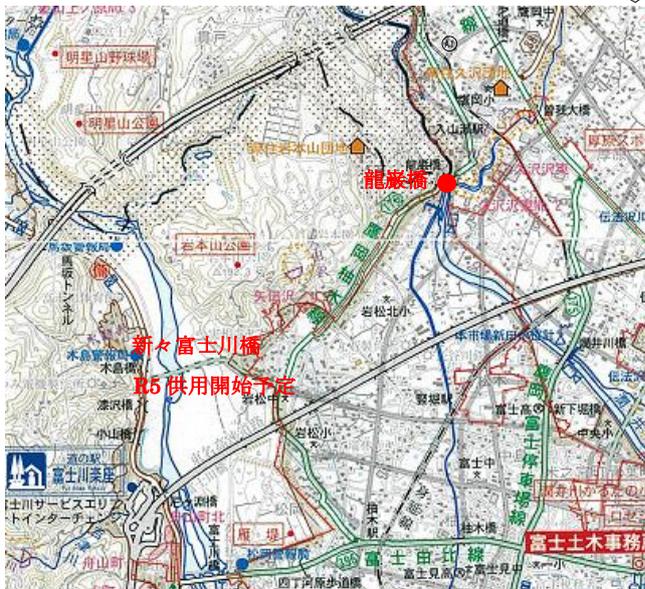

R5当初		（単位：百万円）	
工種	数量	金額	
橋梁拡幅工	1式	242	
計		242	
